



Informazioni Generali

Località :	ITALIA
Macchinario	Mulino a martelli
Settore	Macchine per cementifici
Problematica	Alte vibrazioni
Metodologia	Bilanciamento in opera su due piani

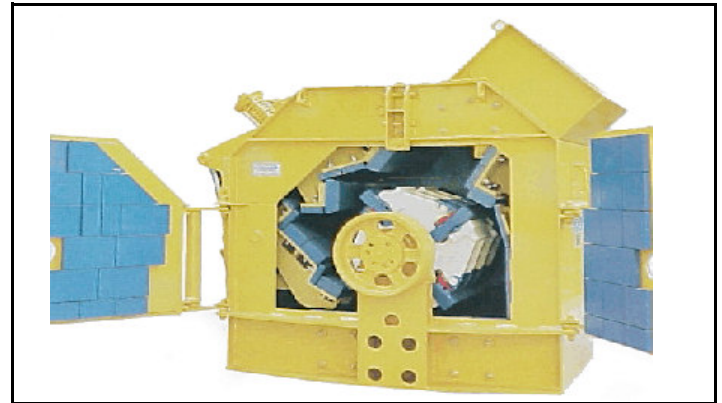


Rilievi effettuati

Attività svolta	rilievi vibrazioni
Attività svolta	Bilanciamento su due piani
Risultato	alti valori vibratori
Evento evitato	impossibilità d'impiego
Conclusioni	
Raccomandazioni	non rimuovere masse di correzione

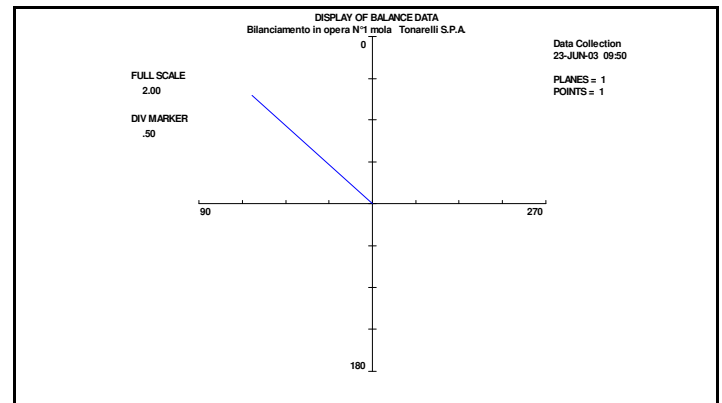

Intervento

Attività svolta	BILANCIAMENTO MULTIPIANO
Esito	Valori Max 0,1 mm/sec
Evento evitato	Rottura e impossibilità impiego
Conclusioni	La macchina lavora senza vibrazioni
Raccomandazioni	non alterare le masse in gioco

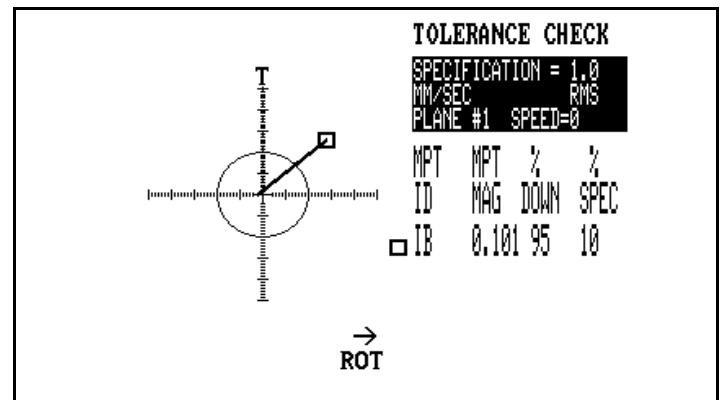

Durata intervento	1 giornata lavorativa
Perdita economica evitata	la macchina era in fermo produzione da circa un mese
